



เอกสาร

แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง กระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน
โครงการก่อสร้างที่ออกแบบโดย
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

พ.ศ.2569

มกราคม

กลุ่มมาตรฐานการสำรวจออกแบบการ
พัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรม
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง กระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน โครงการก่อสร้างที่ออกแบบ
โดยสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

1. ที่มา/ความเป็นมา

กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง จะครอบคลุมหลังจากผู้รับจ้างได้ทำสัญญาจ้างกับกรมพัฒนาที่ดิน หรือหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเองโดย ผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร การตรวจสอบสภาพพื้นที่ การตรวจและควบคุมงาน การรายงานผลการก่อสร้างประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน การรายงานผลการตรวจสอบผลการก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้าประจำงวด และการรายงานการตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง พร้อมข้อเสนอแนะ และเทคนิคที่จำเป็นต่อการจัดทำรายงานผลการก่อสร้าง จนถึงขั้นตอนการส่งมอบงานก่อสร้าง โดยปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกโดย คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


2. กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
- มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
- ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง
- ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน
3. คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 4/2569 ลงวันที่ ...5 มกราคม พ.ศ. 2569... เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

ผังกระบวนการทำงานกระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ผังกระบวนการ 1)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

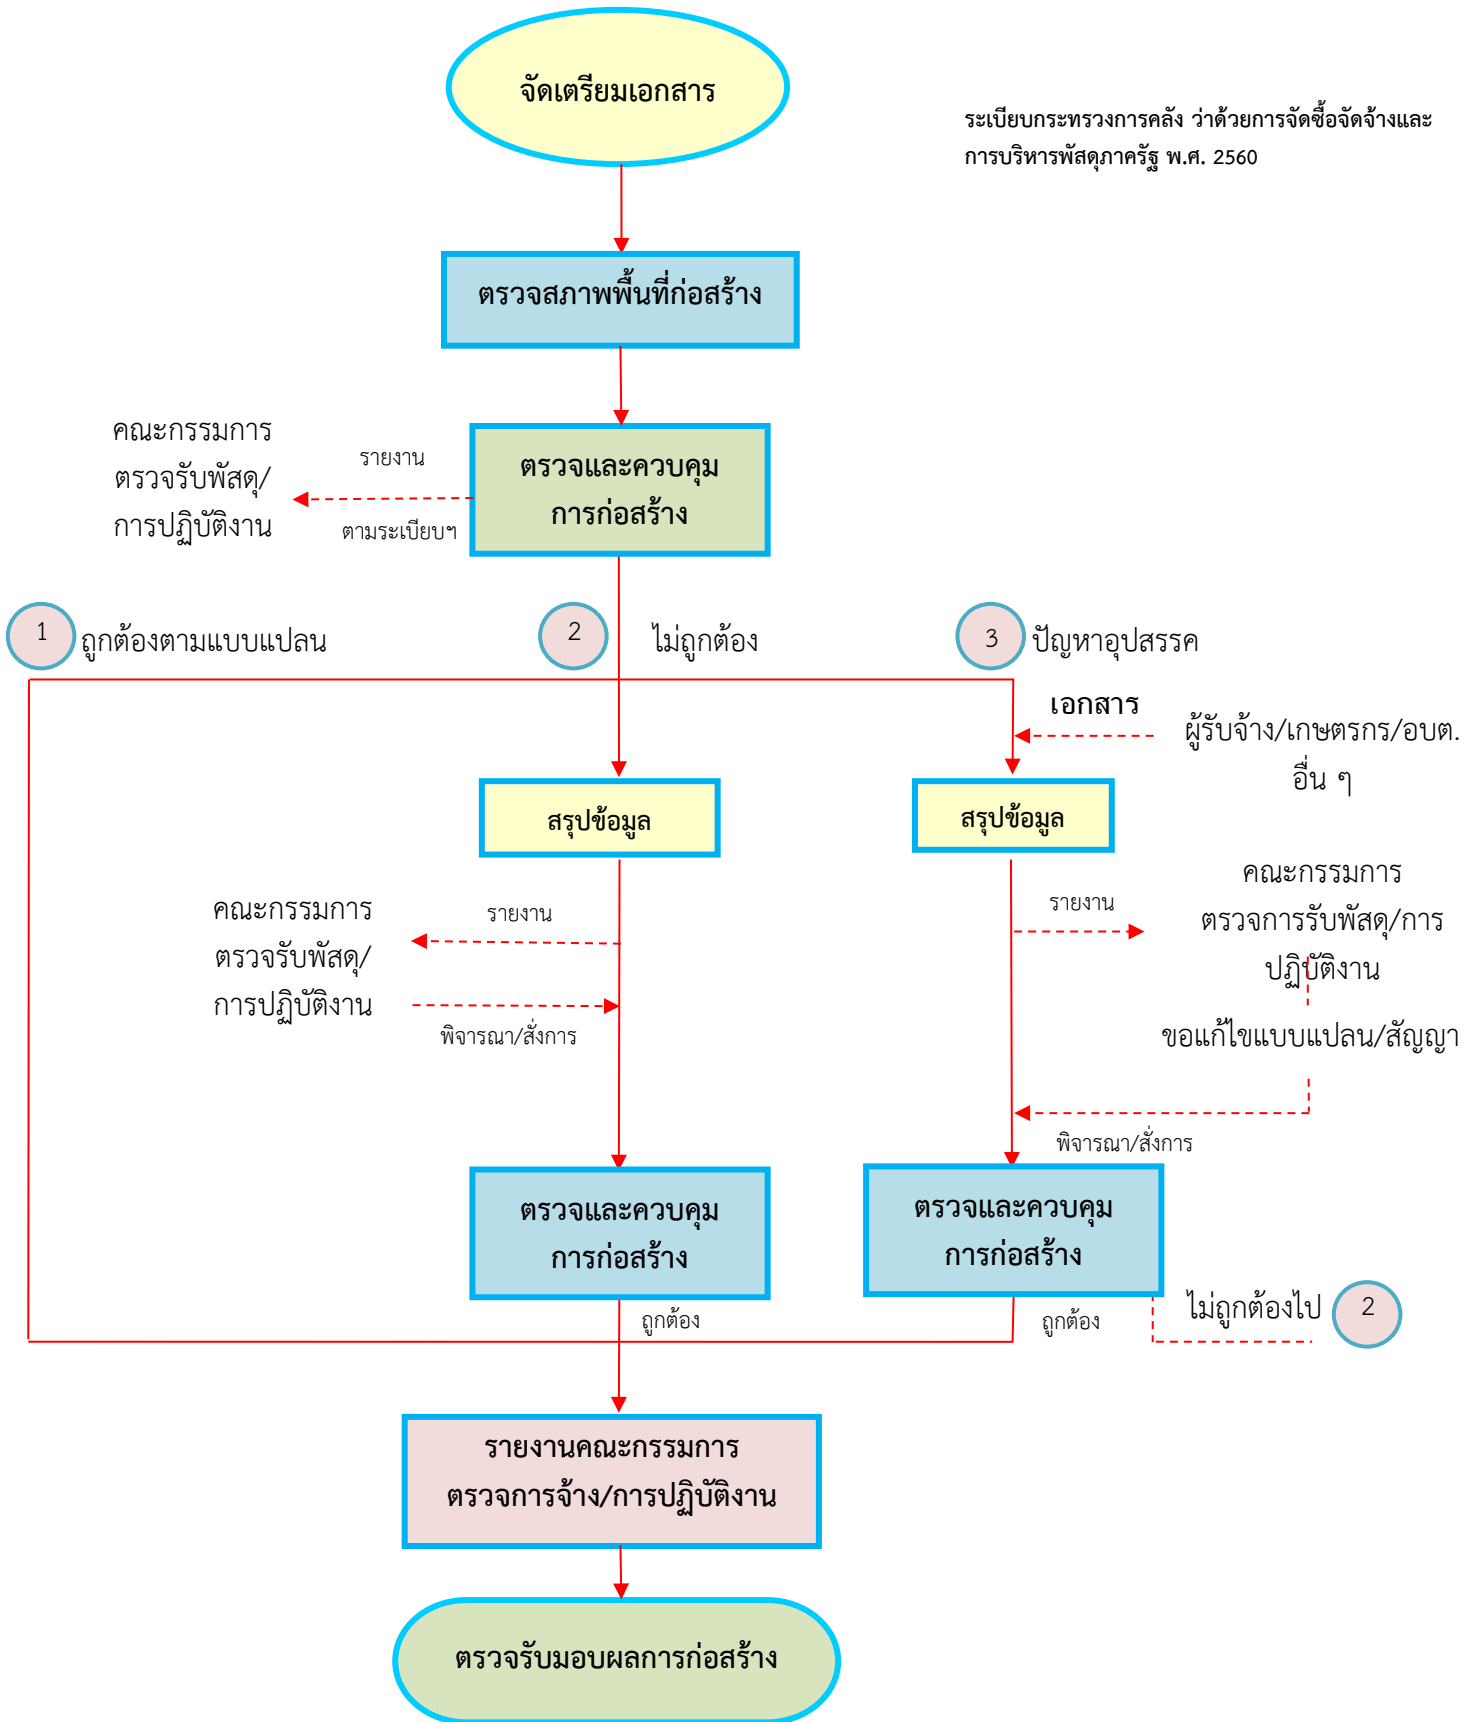

(ร่าง) แผนผังกระบวนการขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน
โครงการก่อสร้างที่ออกแบบโดยสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

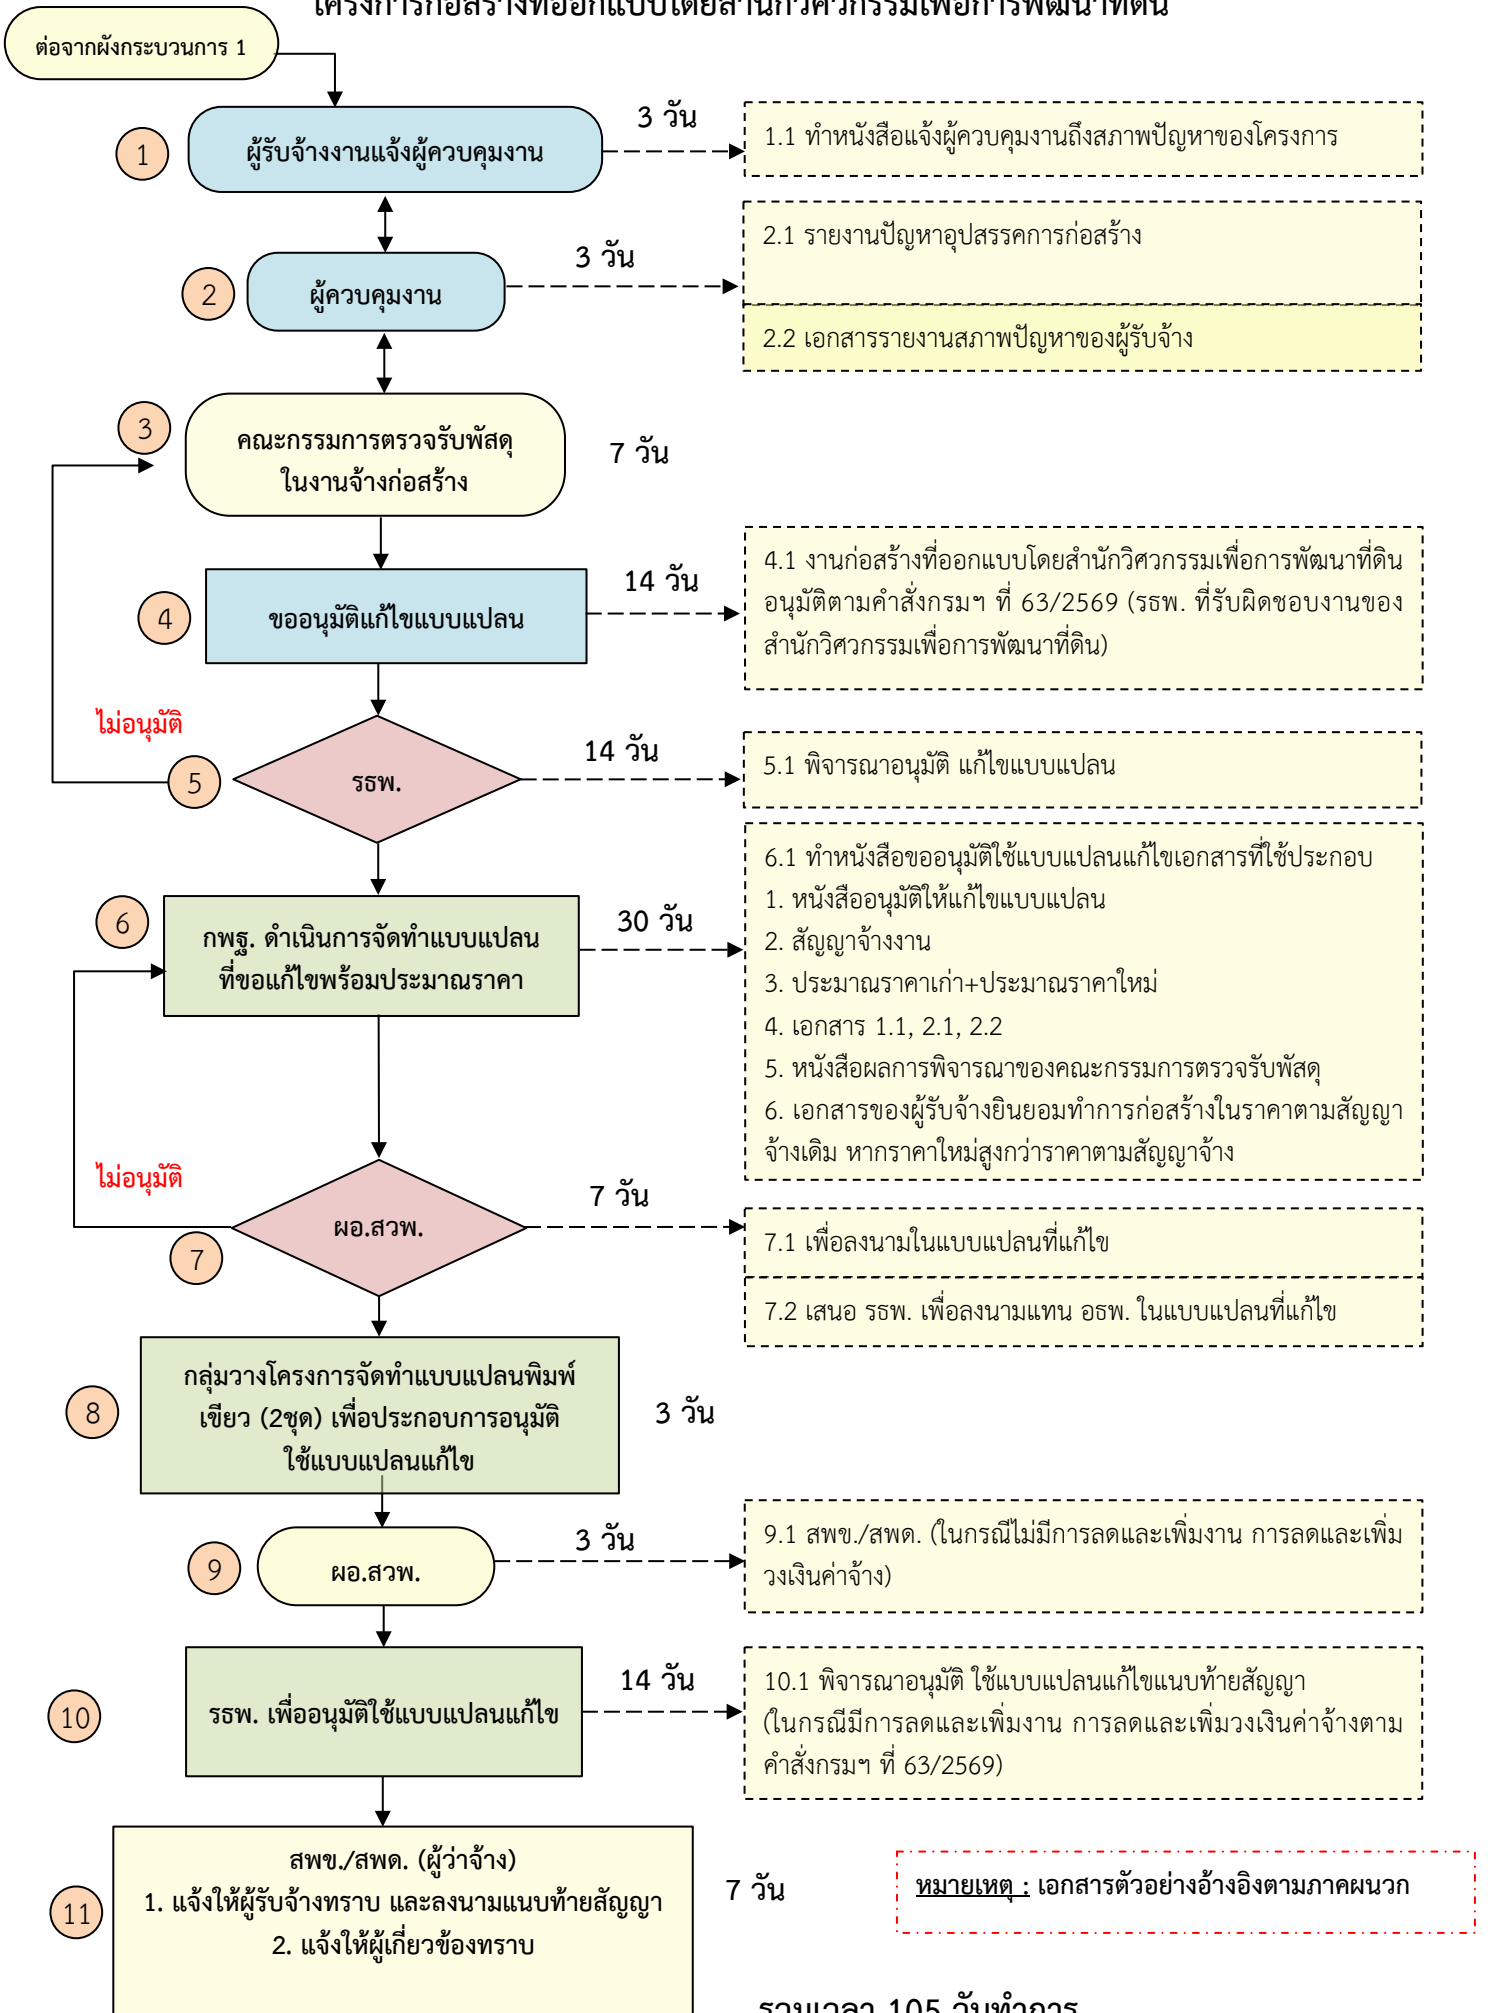

4. ผู้รับผิดชอบตามแผนกระบวนการ

อธพ. : อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

รธป. : รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

ผอ.สวพ. : ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

กมว. : กลุ่มมาตรฐานการสำรวจออกแบบการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรม

กวค. : กลุ่มวางโครงการ

กพฐ. : กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 1-4

วิศวกรโยธา, สถาปนิก, วิศวกร (ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)

นายช่างโยธา (ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส)

5. คณะผู้จัดทำ

1. สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

2. กลุ่มมาตรฐานการสำรวจออกแบบการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรม

3. กลุ่มวางโครงการ

4. กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 1-4

ภาคผนวก



คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน

ที่ ๑๔ / ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน มีคำสั่ง ที่ ๖๒๔/๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คำสั่ง ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินจึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ ๖๒๔/๒๕๖๘
เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๒ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๑. รองอธิบดี มีหน้าที่และอำนาจ สั่งการ อนุมัติหรือดำเนินการในงานของหน่วยงาน
ภายใต้การกำกับดูแล ดังนี้

๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้ทุกกรณี โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง รวมทั้ง มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยพัสดุ หรือคณะกรรมการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ โดยไม่จำกัดวงเงิน

๑.๒ การพิจารณาขอเช่าก่อสร้าง (ค่า K) การลดและเพิ่มงาน การลดและเพิ่ม
วงเงินค่าจ้าง การงัดหรือลดค่าปรับ ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกกรณี เว้นแต่การแก้ไขรูปแบบ
งานก่อสร้างที่ออกแบบโดยสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินให้เป็นอำนาจของรองอธิบดีที่รับผิดชอบงาน
ของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

๒. เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๒.๑ สั่งการ อนุมัติหรือดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้ทุกกรณี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง รวมทั้ง มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ หรือคณะกรรมการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เมื่ออนุมัติการซื้อการจ้างแล้ว ให้รายงานกองคลัง ภายใน ๓ วัน เพื่อรวบรวมเสนออธิบดีทราบ ส่วนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีอำนาจเช่นเดียวกัน ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เว้นแต่ กรณีอื่นตามที่มอบอำนาจให้รองอธิบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานไว้เป็นการเฉพาะ

๒.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง


๒.๒.๑ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อเสนอรองอธิบดีใช้อำนาจสั่งการ อนุมัติ หรือดำเนินการตามข้อ ๑ ทุกกรณี

๒.๒.๒ จำหน่ายพัสดุของกรมพัฒนาที่ดิน ที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก โดยวิธีทอดตลาดหรือวิธีอื่น ยกเว้น ราชการ ในกรณี เมื่อมีการจัดซื้อราชการทดแทนราชการที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้จัดทำรายละเอียดเสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายราชการที่หมดสภาพการใช้งาน และต้องดำเนินการจำหน่ายราชการนั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติและรายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีทราบ

๒.๒.๓ ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง และแบบแจ้งผู้ทำงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกกรณี”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางสาวสุมิตรา วัฒนา)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทร.๑๓๕๒

ที่ กษ๐๘๐๔/๑๕๘

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ปรับแก้การจัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขและปรับลดราคาค่าก่อสร้าง


เรียน ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย

ตามที่ กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้มีบันทึกที่ กษ ๐๘๐๑.๐๒/๓๒๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียน ลนท. เรื่องขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขและปรับลดราคาค่าก่อสร้าง เนื่องจาก รทพ.ปก.ได้มอบหมายให้ กลุ่มนิติการพิจารณาเสนอ กรณี สวพ.โดยกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๓ ได้มีบันทึก ที่ กษ ๐๘๐๔.๐๘/๔๕/๓๒๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง ผอ.สวพ. (ผ่าน ผอ.กพรฐ.๓) เรื่องขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขและปรับลดราคาค่าก่อสร้าง สัญญาเลขที่ e-๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยได้ขออนุมัติยกเลิกแบบแปลนเดิม เลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย.๐๙๕๙ ลักษณะโครงการเป็นงานขุดลอก อ่างเก็บน้ำ ที่ บ.สันป่าสัก ม.๖ ต.แม่มาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา (ตามข้อที่ ๑) และขออนุมัติใช้แบบแปลน เลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย.๐๙๕๙/๑ (แบบแก้ไขครั้งที่ ๑) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมฯให้มีการแก้ไขแบบแปลนแล้ว โดยมีลักษณะโครงการเป็นงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ที่ บ.สันป่าสัก ม.๖ ต.แม่มาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา (ตามข้อที่ ๒) แทนแบบแปลนเดิม ในข้อที่ ๑ นั้น

จากการพิจารณาของกลุ่มนิติการ สำนักงานเลขาธิการกรม เห็นว่าในสัญญาข้อที่ ๒ ได้กำหนดให้แบบรูปรายการก่อสร้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนั้นการขอยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย.๐๙๕๙ นั้น ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์เลิกสัญญา ซึ่งจากบทบัญญัติทางกฎหมายและข้อกำหนดของสัญญามีได้ระบุไว้ว่าสามารถยกเลิกสัญญาเป็นบางส่วนได้ ดังนั้นการขออนุมัติยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น จึงมีสามารถดำเนินการได้ แต่หาก สวพ.มีความประสงค์ให้ รทพ.ปก.อนุมัติยกเลิกการใช้แบบแปลนดังกล่าวข้างต้น ควรใช้ถ้อยคำ ว่า “ขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างจากเดิมแบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย. ๐๙๕๙ แก้ไขใหม่เป็นแบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย ๐๙๕๙/๑ (แบบแก้ไขครั้งที่ ๑)” ซึ่งจะมีผลให้แบบรูปรายการก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย ๐๙๕๙ สิ้นผลไปโดยปริยาย ตามบันทึกกลุ่มนิติการ ที่ กษ ๐๘๐๑.๐๒/๓๒๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งจากการพิจารณา สวพ.เห็นว่าจะขอใช้ถ้อยคำที่ว่า “ขออนุมัติใช้แบบแปลน งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ที่ บ.สันป่าสัก ม.๖ ต.แม่มาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา แบบเลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย ๐๙๕๙/๑ (แบบแก้ไขครั้งที่ ๑) แผ่นที่ ๑/๑๗ ถึง แผ่นที่ ๑๗/๑๗ แทนแบบแปลนเดิม งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ที่ บ.สันป่าสัก ม.๖ ต.แม่มาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา แบบเลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย ๐๙๕๙ แผ่นที่ ๑/๑๖ ถึง แผ่นที่ ๑๖/๑๖” แทนข้อความดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าขั้นตอนการขอแก้ไขแบบแปลนได้ส่งเลขมาแล้วตามที่ข้างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาเสนอกรมฯให้ความเห็นชอบ ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนการขออนุมัติใช้แบบแปลนที่ได้แก้ไขแล้วมาแทนแบบแปลนเดิมเท่านั้น

ดังนั้น กรณีที่มีการแก้ไขแบบแปลนของงานโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือโครงการอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขและปรับลดราคาค่าก่อสร้างแทนแบบแปลนเดิม อันเนื่องมาจากการแก้ไขแบบแปลนตามที่กรมฯ ได้อนุมัติมาแล้วนั้น ขอให้ใช้ถ้อยคำ "ขออนุมัติใช้แบบแปลน งาน..... ที่ บ้าน..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... แบบเลขที่ น. รหัสโครงการ/๑ (แบบแก้ไขครั้งที่ ๑) แผ่นที่.....ถึง แผ่นที่..... แทนแบบแปลนเดิม งาน..... ที่ บ้าน..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... แบบเลขที่..... น. รหัสโครงการ แผ่นที่.....ถึง แผ่นที่....." โดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่า "ขอยกเลิกแบบแปลน" ดังที่เคยดำเนินการมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



(นายอุดม วิภาสไพสิฐ)

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ทราบ

- นายวิเศษ สอนพาศ หน่วยงาน

- นายพร เวชชากรสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิบดี




(นายสมเกียรติ ราชสงคราม)

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๒๗ ๑ ๖๓

- ทราบ




บันทึกข้อความ

เลขที่	๗๕๖๕
วันที่	๒๙ ธ.ค. ๖๖
เวลา	๑๑.๓๐ น.

ส่วนราชการ กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๑๓๐๓
 ที่ กษ ๐๘๐๑.๐๒/๓๒๕ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขและปรับลดราคาก่อสร้าง
 เรียบ ลนค.

ตามที่กรมฯ ได้มีบัญชากลุ่มนิติการพิจารณากรณีที่ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๓ สำนัก
 วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดินมีบันทึกข้อความ ที่ กษ ๐๘๐๔.๐๘/๔๕/๓๒๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ความว่า

๑ ขออนุมัติยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๒๑๓๕๙ น.รหัสโครงการ พย.๐๙๕๙ ทั้งชุด จำนวน ๑๖ แผ่น
 เนื่องจากผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งประสบปัญหาอุปสรรคในการขุดลอกเจอบางส่วนในพื้นที่ที่ทำการ
 ขุดลอก จึงไม่สามารถจะดำเนินการขุดลอกได้ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการ
 ตรวจสอบการจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่พบว่าพื้นที่บางส่วนมีก้อนหินขนาดใหญ่จริงดังที่ช่างควบคุมงานรายงาน
 มา เห็นควรให้มีการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างและปรับลดราคาก่อสร้าง

๒ ขออนุมัติใช้แบบแปลนเลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย.๐๙๕๙/๑ (แบบแก้ไขครั้งที่ ๑)
 ทั้งชุด จำนวน ๑๗ แผ่น

๓ ราคาตามแบบแปลนแก้ไข เป็นเงิน ๔,๙๑๖,๐๐๐ บาท

๔ ราคาตามสัญญาจ้าง ๕,๐๙๙,๐๐๐ บาท

๕ ราคาตามแบบแปลนแก้ไขต่ำกว่าราคาตามสัญญาจ้าง เห็นควรใช้ราคาตามแบบแปลนแก้ไข
 เป็นเงิน ๔,๙๑๖,๐๐๐ บาท


กลุ่มนิติการขอเรียนว่า ตามข้อกำหนดในสัญญาข้อที่ ๒ กำหนดให้แบบรูปรายการก่อสร้างเป็น
 ส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้การขอยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ ๒๑๓๕๙ น.รหัสโครงการ พย.๐๙๕๙ นั้น
 ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาเมื่อเป็นการเลิกสัญญาแล้วคู่กรณีจะใช้สิทธิได้ใน ๒ กรณี แบ่งออกเป็น กรณี
 ที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กรณีที่ ๒ เป็นการใช้สิทธิตามข้อกำหนดแห่งสัญญาและเมื่อ
 พิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและตามข้อกำหนดแห่งสัญญาดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏว่า ทั้งสองกรณี
 กำหนดให้คู่สัญญาใช้สิทธิเลิกสัญญากันได้แต่เพียงบางส่วน ดั่งนี้การที่ขออนุมัติยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง
 ดังกล่าวข้างต้นอันเป็นการยกเลิกสัญญาบางส่วนหาอาจทำได้ไม่ ย่อมเป็นการขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 ประกอบกับเมื่อพิจารณาค่าสั่งมอบอำนาจที่ ๙๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ
 ที่ ๑๑๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่กรมฯ มอบอำนาจให้ รทพ. ปฏิบัติราชการแทน
 ไม่ปรากฏข้อความตอนใดว่าได้มอบอำนาจให้ รทพ. มีอำนาจในการอนุมัติยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้างได้ แต่
 อย่างไรก็ตามหากกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๓ ยังคงประสงค์ให้ รทพ.ปค.อนุมัติยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง
 เลขที่ ๒๑๓๕๙ น รหัสโครงการ พย ๐๙๕๙ ควรใช้ถ้อยคำว่าขออนุมัติแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างจากเดิม
 แบบรูปรายการก่อสร้างเลขที่ ๒๑๓๕๙ น รหัสโครงการ พย ๐๙๕๙ แก้ไขใหม่เป็นแบบรูปรายการก่อสร้าง
 เลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย ๐๙๕๙/๑ (แบบแก้ไขครั้งที่ ๑) ซึ่งจะมีผลให้แบบรูปรายการก่อสร้าง
 เลขที่ ๒๑๓๕๙ น รหัสโครงการ พย ๐๙๕๙ สิ้นผลไปโดยปริยายและอยู่ในดุลพินิจของ รทพ.ปค. พิจารณา
 อนุมัติให้มีการแก้ไขได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ รศพ.ปก. พิจารณา หาก เห็นชอบขอได้โปรดสั่งการให้
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๓ สวพ.ดำเนินการต่อไป



(นายบัญญัติ จันทร์รัตน์)

รศพ.ปก.
เลขที่ ๒๓๖๑
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๑
เลข ๑๕๕๖

นิติกรชำนาญการ



๑๕ พ.ค. ๖๑

สวพ.
เลขรับ ๒๒๗๐
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑
เวลา ๑๐.๑๕๖



๑๕ พ.ค. ๖๑

(นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว)
เลขานุการกรม
๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑

นพ. ๓
เพื่อพิจารณา
ตามที่ กลุ่มวิสาหกิจ รศพ. ใน
แผนรพ.ที่ กส.๐๘๐๑-๐๒/๓๒๔ ลงวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


๑๕ พ.ค. ๖๑

(นายปราโมทย์ ยาใจ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


(นายอุดม วิชาสไพสิฐ)
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน



กวด. สวพ.
เลขที่รับ ๗๕๐
วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผบร. สวพ.
เลขที่รับ ๖๓๖
วันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑
เวลา ๑๖.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ . กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๓ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทร.๕๑๐๗
ที่ กษ. ๐๘๐๕.๐๘/๕๕/๓๒๗
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขและปรับลดราคาค่าก่อสร้าง สัญญาเลขที่ e-๐๗/๒๕๖๐ จังหวัดพะเยา
เรียน ผอ.สวพ. (ผ่าน ผอ.กพฐ.๓)

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๓ ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขและปรับลดราคาค่าก่อสร้าง
งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑ โครงการ

ลักษณะงาน

ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัส
โครงการ พย.๐๙๕๙ แบบเลขที่ ๒๑๓๕๙ น. จำนวน ๑๖ แผ่น

โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรทิพย์นวกิจ ทำการก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ e-๐๗/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๕,๐๙๙,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สรุปผลได้ดังนี้

๑. ขออนุมัติยกเลิกแบบแปลน เลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย.๐๙๕๙ ทั้งชุด จำนวน
๑๖ แผ่น เนื่องจากพบปัญหาอุปสรรคในการขุดลอก คือเจอหินใหญ่บางส่วนในพื้นที่ทำการขุดลอก จึงไม่
สามารถดำเนินการขุดลอกได้ตามรูปแบบรายการ ตามหนังสือแจ้งของผู้รับจ้างเรื่อง แจ้งอุปสรรคในการทำงาน
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ หนังสือรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา ของช่างผู้ควบคุมงาน ลง
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้เข้าตรวจสอบ
พื้นที่ร่วมกันพบว่าพื้นที่ขุดลอกบางส่วนเป็นหินใหญ่จริง เห็นควรให้แก้ไขแบบแปลนโดยไม่หยุดงาน และปรับ
ลดราคาค่าก่อสร้างลง โดยผู้รับจ้างไม่ขัดข้อง ตามบันทึกข้อความคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ กษ ๐๘๑๕.๐๑/๕๗
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ และ
หนังสือแจ้งของผู้รับจ้าง เรื่อง ยินยอมให้ปรับลดค่าจ้างงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

๒. ขออนุมัติใช้แบบแปลน เลขที่ ๒๑๓๕๙ น. รหัสโครงการ พย.๐๙๕๙/๑ (แบบแก้ไขครั้งที่
๑) ทั้งชุด จำนวน ๑๗ แผ่น


๓. ราคาตามแบบแปลนแก้ไข เป็นเงิน ๔,๙๑๖,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)

๔. ราคาตามสัญญาจ้าง ๕,๐๙๙,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. ราคาตามแบบแปลนแก้ไขต่ำกว่าราคาตามสัญญาจ้าง เห็นควรใช้ราคาตามแบบแปลนแก้ไข
เป็นเงิน ๔,๙๑๖,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


- ลงนามแล้ว
- ทวค. เพื่อถัก เน้นทง๙๐ไป



(นายอุดม วิภาสไพสิฐ)

ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

(นายสุรินทร์ พันธุ์สิงห์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ




สำเนา รพ.พ.ก.
 เลขที่รับ ๑๕๕๕
 วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑
 เวลา ๑๓.๕๐ น.

ผ.บร. สวพ.
 เลขที่รับ ๒๓
 วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑
 เวลา ๑๓.๕๐ น.

รพ.พ.ก.
 เลขที่รับ ๒๓๕๕
 วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑
 เวลา ๑๓.๕๐ น.


ตามที่ได้รับมา
 เพื่อดำเนินการ


 (นายภูวนัย กิตติสุวรรณกุล)
 ผู้อำนวยการกลุ่มวางโครงการ
 ๒๓ พ.ค. ๖๑

เรียน ผอ.สวพ.

กต. ได้ติดต่อขออนุมัติพิมพ์เขียววางก่อสร้าง
 งานชุดลอกอ่างเก็บน้ำ ม.สันป่าสัก ม.๒ ต.แม่ยาว อ.เมือง
 จ.พะเยา หมายเลขที่ 21369 น. เพื่อใช้ประกอบกรณี
 แผนพัฒนา ๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นสมควร เฝ้ารับ
 จรพ. ผ.ก. เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป


 (นายภูวนัย กิตติสุวรรณกุล)
 ผู้อำนวยการกลุ่มวางโครงการ


ที่ กษ ๐๘๐๘.....๑๕๐๓
 เรียง รพ.พ.ก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการใช้แบบแปลนแก้ไขและ
 ปรับลดราคาค่าก่อสร้างงานชุดลอกอ่างเก็บน้ำ สัญญาเลขที่
 e-๐๓/๒๕๖๐ จังหวัดพะเยา และเห็นสมควรมอบหมาย
 สทพ.๗/สพด.พะเยา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายอุดม วิภาสพิสิฐ)


ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายปรามไทย์ ยาใจ




(นายปรามไทย์ ยาใจ)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นางสาวกัญญา
 นิ่มนวล


 ๒๕ พ.ค. ๖๑

399



รับ ๑๘ พ.

- ๖๐ ปี ๒๕๖๐ สวพ.พ.ก.
- ลว.ค.๒๕๖๐ ๑๒ พ.ค. ๖๐
- ส.ค.๒๕๖๐ ๑๒ พ.ค. ๖๐
- ส.ค.๒๕๖๐ ๒๘ ธ. ๖๐
- ส.ค.๒๕๖๐ ๕ ธ. ๖๑
- ส.ค.๒๕๖๐ ๒๓ พ.ค. ๖๑
- ส.ค.๒๕๖๐ ๓๐ พ.ค. ๖๑
- ส.ค.๒๕๖๐ ๓๐ พ.ค. ๖๑
- ๓๐ พ.ค. ๖๑



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

* สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ ๖ *

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองช่าง โทร. 02579 8537 E-mail:egd_5@ldd.go.th

ที่ กษ 0804.04/

วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบบูรณาการละเอียดงาน สัญญาเลขที่ สทค.จบ.10/2553

เรียน ผอ.กช.

ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 1 โครงการ
ลักษณะงาน ฝ่ายน้ำล้น บ.จ.บมจล ม.10 ต.หนองศาลง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ตามแบบเลขที่ 30251 น.
รหัสโครงการ จบ.1251/1 (แบบแก้ไขครั้งที่ 1) จำนวน 12 แผ่น

โดยว่าจ้าง หจก. ไชยชนิกุล สัญญาจ้างเลขที่ สทค.จบ.10/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
วงเงินในสัญญาจ้าง 3,178,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

สรุปผลได้ดังนี้

1. เหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เนื่องจาก ทางห้างฯ ได้ทำการขุดลอกได้ระดับหนึ่งพบว่า
พื้นชั้นล่างมีสภาพเป็นชั้นหินแข็ง ทำให้ทางห้างฯ ไม่สามารถขุดลอกตามแบบแปลนที่กำหนดได้ แต่เกษตรกร
บริเวณทั้งสองข้างคลองต้องการให้ขุดลอกขยายความกว้างออกไปตลอดแนวคลองที่ขุดลอกอีกประมาณ 5.00 เมตร
เพื่อให้ฝ่ายสามารถเก็บน้ำได้มากขึ้น

2. ขออนุมัติยกเลิกแบบแปลนเลขที่ 30251 น. รหัสโครงการ จบ.1251 แผ่นที่ 1/11 ถึงแผ่นที่ 11/11
จำนวน 11 แผ่น

3. ขออนุมัติใช้แบบแปลนเลขที่ 30251 น. รหัสโครงการ จบ.1251/1 (แบบแก้ไขครั้งที่ 1) แผ่นที่ 1/12
ถึงแผ่นที่ 12/12 จำนวน 12 แผ่น

4. ราคากลางตามแบบแปลนเดิมเป็นเงิน 3,180,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

5. ราคากลางตามแบบแก้ไขใหม่เป็นเงิน 3,303,000 บาท (สามล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน)

6. ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนตามราคาในสัญญาที่ผู้รับจ้างเสนอตามราคาตามแบบแปลน
แก้ไขใหม่เป็นเงิน $3,178,000 \times 3,303,000 \div 3,180,000 = 3,300,922.64$ บาท (สามล้านสามแสนเก้าร้อยยี่สิบสองบาทหก
สิบสี่สตางค์)

7. ดังนั้นราคาแก้ไขใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเงิน $3,300,922.64 - 3,178,000 = 122,922.64$ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)

8. ทั้งนี้ทางห้างยินดีที่จะให้แก้ไขแบบแปลนและทำการก่อสร้างในราคาเดิม

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารขอแก้ไขแบบแปลนงานดังกล่าว จำนวน 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไป

(นายประจักษ์ ภิญญานุกานต์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เลขที่ ชก.013/2553

ที่ทำการห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชนิกุล

เลขที่ 7/1 หมู่ 5 ตำบลทรายขาว

อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 8 เมษายน 2553

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต

เลขที่ ๔๔/2553

วันที่ 8 เม.ย. 53

เวลา 14.00 น.

เรื่อง แจ้งอุปสรรคการก่อสร้างงานสัญญาเลขที่ สพด.จบ.10/2553

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านช่างควบคุมงาน)

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชนิกุล ได้รับจ้างกรมพัฒนาที่ดิน ก่อสร้างฝายน้ำล้น ที่บ้านข้ามมงคล หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตากง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาเลขที่ สพด.จบ.10/2553 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 แบบเลขที่ 30251 น. นั้น ขณะนี้ห้างฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารฝายน้ำล้นเสร็จแล้ว ยังคงเหลือแต่เฉพาะงานส่วนที่จะต้องขุดลอกคลองบริเวณหน้าฝาย ซึ่งขณะนี้ทางห้างฯ กำลังดำเนินการอยู่ ปรากฏว่าเมื่อขุดลอกได้ระดับหนึ่งพบว่าพื้นชั้นล่างมีสภาพเป็นหินแข็ง ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถขุดลอกให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดไว้ในสัญญาได้ โดยบางส่วนมียังค่าความลึกขาดไปประมาณ 0.20 - 1.50 เมตร ตลอดแนวคลอง แต่เนื่องจากเกษตรกรบริเวณสองข้างคลองที่ขุดลอกเห็นว่า เพื่อให้ฝายนี้สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้น จึงขอให้ห้างฯ ทำการขุดลอกขยายความกว้างออกไปตลอดแนวคลองที่ขุดลอกอีกประมาณ 5.00 เมตร ซึ่งห้างฯ ยินดีที่จะดำเนินการตามความต้องการของเกษตรกร โดยหากปริมาณงานที่ทำเพิ่มมากกว่าที่แบบแปลนกำหนดมา ทางห้างฯ ยินดีดำเนินการให้โดยไม่ขอเรียกจ่ายเงินเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้กรมพัฒนาที่ดินแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้กับทางห้างฯ ต่อไป



ในนามของกรมพัฒนาที่ดิน
/ที่ปรึกษาโครงการ

8/เม.ย.53

8/เม.ย.53

โทร.08-1723-8178 , 08-0630-8444

โทรสาร. 0-3949-6446

ในกรณีไม่ใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างในการคำนวณ ราคาแก้ไขใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่.....สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทร.....

ที่ กษ ๐๘๐๔...../..... วันที่

เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขงานก่อสร้าง สัญญาเลขที่...../.....

เรียน ผอ.สวท. ผ่าน ผอ.กพร.....

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่.....ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขงานก่อสร้างโครงการ.....
.....จำนวน ๑ โครงการ

ลักษณะงาน.....ที่บ้าน.....หมู่ที่.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ตามแบบเลขที่.....

รหัสโครงการ.....จำนวน.....แผ่น

โดยว่าจ้าง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....สัญญาเลขที่...../
ลงวันที่.....วงเงินในสัญญาจ้าง.....บาท (.....)

สรุปผลได้ดังนี้

๑.เหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เนื่องจาก.....

และกรมฯ ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนแล้ว เมื่อวันที่.....

๒.ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไข งาน.....ที่บ้าน.....
หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

แบบเลขที่.....รหัสโครงการ...../๑ (แบบแก้ไขครั้งที่๑) แผ่นที่.....ถึงแผ่นที่.....

แทนแบบแปลนเดิม งาน.....ที่บ้าน.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....แบบเลขที่.....

รหัสโครงการ.....แผ่นที่.....ถึงแผ่นที่.....

๓.ราคากลางตามแบบแปลนเดิม เป็นเงิน.....บาท (.....)

๔.ราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลนแก้ไขใหม่ เป็นเงิน.....บาท
(.....)

๕.ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนตามราคาในสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างเสนอตามราคากลางแบบแปลน
แก้ไขใหม่ เป็นเงิน $\frac{\text{ราคาตามสัญญาจ้าง} \times \text{ราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลนแก้ไขใหม่}}{\text{ราคากลางตามแบบแปลนเดิม}}$ บาท (.....)

๖.ดังนั้นราคาค่าก่อสร้างแก้ไขใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นเงิน.....บาท
(.....)

๗.เนื่องจากราคาตามแบบแปลนแก้ไขใหม่สูงกว่าราคาตามสัญญาจ้าง เห็นควรยื่นราคาตามสัญญาจ้าง
เดิมเป็นเงิน.....บาท (.....)

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการขอแก้ไขแบบแปลนมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ (นาย.....)
ตำแหน่ง

ในกรณีไม่ใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างในการคำนวณ ราคาแก้ไขใหม่ลดลงจากเดิม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่..... สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทร.....

ที่ กษ ๐๘๐๔...../..... วันที่

เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขงานก่อสร้าง สัญญาเลขที่...../.....

เรียน ผอ.สวท. ผ่าน ผอ.กพร.....

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่..... ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขงานก่อสร้างโครงการ.....
.....จำนวน ๑ โครงการ

ลักษณะงาน.....ที่ บ้าน.....หมู่ที่.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ตามแบบเลขที่.....

รหัสโครงการ.....จำนวน.....แผ่น

โดยว่าจ้าง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....สัญญาเลขที่...../
ลงวันที่.....วงเงินในสัญญาจ้าง.....บาท (.....)

สรุปผลได้ดังนี้

๑.เหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เนื่องจาก.....

และกรมฯ ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนแล้ว เมื่อวันที่.....

๒.ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไข งาน.....ที่ บ้าน.....
หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

แบบเลขที่.....รหัสโครงการ...../๑ (แบบแก้ไขครั้งที่๑) แผ่นที่.....ถึงแผ่นที่.....

แทนแบบแปลนเดิม งาน.....ที่ บ้าน.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....แบบเลขที่.....

รหัสโครงการ.....แผ่นที่.....ถึงแผ่นที่.....

๓.ราคากลางตามแบบแปลนเดิม เป็นเงิน.....บาท (.....)

๔.ราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลนแก้ไขใหม่ เป็นเงิน.....บาท
(.....)

๕.ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนตามราคาในสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างเสนอตามราคากลางแบบแปลน
แก้ไขใหม่ เป็นเงิน $\frac{\text{ราคาตามสัญญาจ้าง} \times \text{ราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลนแก้ไขใหม่}}{\text{ราคากลางตามแบบแปลนเดิม}}$ บาท (.....)

๖.ดังนั้นราคาค่าก่อสร้างแก้ไขใหม่ลดลงจากเดิม เป็นเงิน.....บาท
(.....)

๗.เนื่องจากราคาตามแบบแปลนแก้ไขใหม่ต่ำกว่าราคาตามสัญญาจ้าง เห็นควรปรับลดราคาค่าก่อสร้าง
และใช้ราคาตามแบบแปลนแก้ไขใหม่เป็นเงิน.....บาท (.....)

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการขอแก้ไขแบบแปลนมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ (นาย.....)

ตำแหน่ง

ในกรณีใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างในการคำนวณ ราคาแก้ไขใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่..... สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทร.....

ที่ กษ ๐๘๐๔...../..... วันที่

เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขงานก่อสร้าง สัญญาเลขที่...../.....

เรียน ผอ.สวท. ผ่าน ผอ.กพร.....

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่..... ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขงานก่อสร้างโครงการ.....
.....จำนวน ๑ โครงการ

ลักษณะงาน.....ที่ บ้าน.....หมู่ที่.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ตามแบบเลขที่.....

รหัสโครงการ.....จำนวน.....แผ่น

โดยว่าจ้าง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....สัญญาเลขที่...../
ลงวันที่.....วงเงินในสัญญาจ้าง.....บาท (.....)

สรุปผลได้ดังนี้

๑.เหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เนื่องจาก.....

และกรมฯ ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนแล้ว เมื่อวันที่.....

๒.ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไข งาน.....ที่ บ้าน.....
หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

แบบเลขที่.....รหัสโครงการ...../๑ (แบบแก้ไขครั้งที่๑) แผ่นที่.....ถึงแผ่นที่.....

แทนแบบแปลนเดิม งาน.....ที่ บ้าน.....หมู่ที่.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....แบบเลขที่.....

รหัสโครงการ.....แผ่นที่.....ถึงแผ่นที่.....

๓.ราคากลางตามแบบแปลนเดิม เป็นเงิน.....บาท (.....)

๔.ราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลนแก้ไขใหม่ เป็นเงิน.....บาท
(.....)

๕.ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนตามราคาในสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างเสนอตามราคากลางแบบแปลน
แก้ไขใหม่ เป็นเงิน $\frac{\text{ราคาตามสัญญาจ้าง} \times \text{ราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลนแก้ไขใหม่}}{\text{ราคากลางตามแบบแปลนเดิม}}$ บาท (.....)

๖.ดังนั้นราคาค่าก่อสร้างแก้ไขใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นเงิน.....บาท
(.....)

๗.เนื่องจากราคาตามแบบแปลนแก้ไขใหม่สูงกว่าราคาตามสัญญาจ้าง เห็นควรยื่นราคาตามสัญญาจ้าง
เดิมเป็นเงิน.....บาท (.....)

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการขอแก้ไขแบบแปลนมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ (นาย.....)

ตำแหน่ง

ในกรณีใช้ราคาต่อหน่วยตามสัญญาจ้างในการคำนวณ ราคาแก้ไขใหม่ลดลงจากเดิม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่..... สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน โทร.....

ที่ กษ ๐๘๐๔...../..... วันที่

เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขงานก่อสร้าง สัญญาเลขที่...../.....

เรียน ผอ.สวท. ผ่าน ผอ.กพร.....

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่..... ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขงานก่อสร้างโครงการ.....
.....จำนวน ๑ โครงการ

ลักษณะงาน.....ที่ บ้าน.....หมู่ที่.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ตามแบบเลขที่.....
รหัสโครงการ.....จำนวน.....แผ่น

โดยว่าจ้าง บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....สัญญาเลขที่...../
ลงวันที่.....วงเงินในสัญญาจ้าง.....บาท (.....)

สรุปผลได้ดังนี้

๑.เหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลน เนื่องจาก.....

และกรมฯ ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนแล้ว เมื่อวันที่.....

๒.ขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไข งาน.....ที่ บ้าน.....
หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
แบบเลขที่.....รหัสโครงการ...../๑ (แบบแก้ไขครั้งที่๑) แผ่นที่.....ถึงแผ่นที่.....
แทนแบบแปลนเดิม งาน.....ที่ บ้าน.....หมู่ที่.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....แบบเลขที่.....
รหัสโครงการ.....แผ่นที่.....ถึงแผ่นที่.....

๓.ราคากลางตามแบบแปลนเดิม เป็นเงิน.....บาท (.....)

๔.ราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลนแก้ไขใหม่ เป็นเงิน.....บาท
(.....)

๕.ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนตามราคาในสัญญาจ้างที่ผู้รับจ้างเสนอตามราคากลางแบบแปลน
แก้ไขใหม่ เป็นเงิน $\frac{\text{ราคาตามสัญญาจ้าง} \times \text{ราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลนแก้ไขใหม่}}{\text{ราคากลางตามแบบแปลนเดิม}}$ บาท (.....)

๖.ดังนั้นราคาค่าก่อสร้างแก้ไขใหม่ลดลงจากเดิม เป็นเงิน.....บาท
(.....)

๗.เนื่องจากราคาตามแบบแปลนแก้ไขใหม่ต่ำกว่าราคาตามสัญญาจ้าง เห็นควรปรับลดราคาค่าก่อสร้าง
และใช้ราคาตามแบบแปลนแก้ไขใหม่เป็นเงิน.....บาท (.....)

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารการขอแก้ไขแบบแปลนมาด้วย จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ (นาย.....)

ตำแหน่ง

QR CODE

หนังสือขออนุมัติใช้แบบแปลนแก้ไขงานก่อสร้าง

